



वार्षिक प्रगति - २०८२

1

प्रस्तुतकर्ता:

डि.प्र. भेष राज भुसाल

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन

कार्यालय

रुपन्देही

कृषिको आधार : सिँचाइमा सुधार



प्रस्तुती सूची

2

- कार्यालयको जनशक्ति विवरण
- वार्षिक प्रगति सारांश
- बजेटको श्रोत अनुसार प्रगति विवरण
- बहुवर्षिय आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था
- खुद परिमाणात्मक उपलब्धि विवरण
- बेरुजु सम्बन्धी विवरण
- केही स्थलगत फोटोहरू

कार्यालयको समष्टिगत जनशक्ति विवरण


क्र.सं.	सेवा	स्वीकृत दरबन्दी			पदपूर्ति	स्थायी रिक्त दरबन्दी	कैफियत
		स्थायी	अस्थायी	जम्मा			
१	प्राविधिक	१०	-	१०	८	२	
२	प्रशासनिक	६	-	६	६	-	कार्यालय सहयोगी समेत गरि
	कूल	१६	१	१६	१४	२	

वार्षिक प्रगति सारांश

रु.हजारमा

क्र.सं.	बजेट शिर्षक	वार्षिक विनियोजन	विनियोजित संशोधित बजेट रोक्का समेत घटाइ (अन्तिम बजेट)	हालसम्मको खर्च	खर्च (%)	कैफियत
१	चालु	१३२६०	१३१००	१२७८६.१५	९७.६०	
२	पूँजीगत	२०९५५०	१८७८९१.४५५	१५७६९६.२५३	८३.९३	
	कूल जम्मा	२२२८१०	२००९९१.४५५	१७०४८२.४०३	८४.८२	

Total Budget : 220,310,000 (Pie Chart)



● Expense (77.4%) ● Remaining (22.6%)

बजेटको स्रोत अनुसार वार्षिक प्रगति विवरण

रु.हजारमा

सि. नं.	बजेटको स्रोत	जम्मा आयोजना संख्या	वार्षिक विनियोजन	विनियोजित अन्तिम बजेट	हाल सम्मको खर्च	प्रगति		कार्यान्वयनमा गएका आयोजना संख्या	सम्पन्न भएका आ. संख्या	कार्यान्वयन नभएका आ. संख्या	कैफियत
						भौतिक (%)	वित्तीय (%)				
१	समानिकरण/ राजश्व अनुदान	७३	१०४५५०	८२८९१.४५५	७८७११.७६	९५.००	९४.८६	५९	५७	१४	२ वटा बहुवर्षिय. क्रमागत
२	संघ शसर्त अनुदान	६	१०५०००	१०५०००	७८९८४.५०	९८.००	७५.२२	६	५	०	
	जम्मा	७९	२०९५५०	१८७८९१.४५५	१५७६९६.२५३	९६.५०	८३.९३	६५	६२	१४	

बजेटको शिर्षक अनुसार वार्षिक प्रगति विवरण

Account Name	Budget	Expense	Remaining	Progress	
308000154-मझौला तथा बैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम	Rs. 42,315,000	Rs. 33,664,548	Rs. 8,650,452	79.56%	९२.१९ %
308000184-सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	Rs. 40,930,000	Rs. 30,267,722	Rs. 10,662,278	73.95%	९७.४२ %
308911214-नदी नियन्त्रण(संघ शसर्त अनुदान)	Rs. 20,000,000	Rs. 12,264,860	Rs. 7,735,140	61.32%	६१.३२ %
308000174-जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	Rs. 4,000,000	Rs. 3,791,394	Rs. 208,606	94.78%	९४.७८%
308000204-जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	Rs. 14,805,000	Rs. 10,988,093	Rs. 3,816,907	74.22%	९७.२०%
308000123-जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयहरु	Rs. 13,260,000	Rs. 12,786,150.55	Rs. 473,849.45	96.43%	९७.६०%
308911224-मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ शसर्त अनुदान)	Rs. 85,000,000	Rs. 66,719,636	Rs. 18,280,364	78.49%	७८.४९%

कार्यालयमा बहुवर्षिय योजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्था

रकम रु हजारमा

क्र. सं.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	आ.व.०८२/८३ विनियोजित रकम (रकमान्तर सहित)	आ.व.२०८२/८३ को खर्च	हाल सम्मको खर्च	प्रगति (प्रतिशत)		यस आ.व.को लागि आवश्यक रकम	यस आ.व.को विनियोजित रकम	योजना सम्मपन्न हुने वर्ष
							भौतिक	वित्तीय			
१	कंचन सिँचाइ योजना, सैनामैना न.पा. १०,११ रुपन्देही ।	६९०९४	४६२००.१२	८१९६.९२	८१३३.३२	३६१५४.५६	८५	७८.२६	११०००	८०००	०८३/८४
२	५ मौजा तपाहा सिँचाइ योजना बुटवल १८,१९ रुपन्देही ।	२३४६७	१०४९५.०७	६८००.९२	५६८४.३२	९६८९.२३	९५	९२.३२	१०००	५००	०८३/८४
३	मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ योजना रुपन्देही	२२१५३३	-	६७४९.२२	६४२०.४७				१०६७००	३००००	०८४/८५
	कुल जम्मा								११८६००	३८५००	

कार्यक्रमगत खुद परिमाणात्मक वार्षिक प्रगति विवरण (सिंचाइ)

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	सिंचाइ बाँध/मुहान	पक्की नहर/कुलो	लिफ्ट सिंचाइ	पाइप लाइनिङ	थप सिंचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्र	सिंचाइ संरचना सुदृढीकरण गरेको क्षेत्र	नदीमा नियन्त्रण (तटबन्ध निर्माण)	नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन	तटबन्धबाट सुरक्षित भएको	
क	समानिकरण	वटा	कि.मी.	वटा	कि.मी.	हे.	हे.	कि.मी.	हे.	घर	हे.
१	मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिं	०	१.८६६		०.३११	६०	५४६				
२	सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार	३	२.७४७		०.३११		७०४				
३	जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन	-						०.२२९	२	१३	२२
५	जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण	-									
	समानिकरण जम्मा	३	४.६१३		०.३११	६०	१२५०	०.२२९	२	१३	
ख	संघ सशर्त अनुदान										
१	मर्मत संभार आयोजनाहरू	-	३.९४९				१०००				
२	नदी नियन्त्रण	-						०.४५५	१	६	१३
	जम्मा		३.९४९				१०००	०.४५५	१	६	१३
	कुल जम्मा क+ख	३	८.५६२		०.३११	६०	२२५०	०.६८४	३	१९	३५

कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कार्यक्रम	वार्षिक विनियोजन (रु.हजारमा)	अन्तिम बजेट रोक्का र रकमान्तर पश्चात	जिल्ला	कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण
१	रोहिणी सिंचाई योजना, देवदह, तिलोत्तमा	मझौला तथा बैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम	१५००	०	रुपन्देही	करिब ५ वर्षदेखि योजना अलपत्र अवस्थामा । कसरी अगाडी बढ्ने निर्णयमा पुग्न नसकिएको
२	सियारी बबुरिया सिंचाई योजना, सियारी गा.पा.	मझौला तथा बैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम	३५००	०	रुपन्देही	बहुवर्षिय स्वीकृतको लागि पेश गरिएको तर स्वीकृत नभएको । पुन बहुवर्षिय स्वीकृतको लागि पेश गरिने
३	सिंचाइ गुरुयोजना तयारीका लागि तथ्याङ्क संकलन कार्य (Inventory survey)-रुपन्देही	मझौला तथा बैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम	५००	०	रुपन्देही	बजेट सम्पन्न गर्ने, २. बजेट सुनिश्चित नभएका र यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण हुने आयोजनाहरूको डि.पि.आर. तथा EIA/IEE तथा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयन नगर्ने; बहुवर्षिय आयोजना तयारीका लागि आवश्यक डि.पि.आर., EIA/IEE तथा सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका कार्यहरू आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिई कार्यान्वयन गर्ने, ३. बजेट सुनिश्चित नभएका र यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण हुने आयोजनाहरूको डि.पि.आर. तथा EIA/IEE तथा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयन नगर्ने; बहुवर्षिय आयोजना तयारीका लागि आवश्यक डि.पि.आर., EIA/IEE तथा सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका कार्यहरू आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिई कार्यान्वयन गर्ने,
४	परामर्श सेवा - रुपन्देही (विभिन्न सिंचाइ तथा नदि नियन्त्रण आयोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यहरू	मझौला तथा बैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम	५००	०	रुपन्देही	
५	वडा नं. ३ र ४ को पक्की पुलमुनि वारीपारी करिब २०० घरहरू संरक्षण गर्न तटबन्ध निर्माण	जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१२००	०	रुपन्देही	
६	रम्वापुर सिंचाई योजना बुद्धनगर ३ रुपन्देही	सिंचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	१०००	०	रुपन्देही	
७	कृष्णपुर बुटवल हुदै तुलसीजञ्ज जोड्ने कुलो सिंचाई आयोजना	सिंचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	१०००	०	रुपन्देही	ठेगाना नखुलेको ।

कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कार्यक्रम	वार्षिक विनियोजन (रु.हजारमा)	अन्तिम बजेट रोक्का र रकमान्तर पश्चात	जिल्ला	कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण
८	कृष्णपुर बुटवल हुदै तुलसीजञ्ज जोड्ने कुलो सिचाई आयोजना	सिँचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	१०००		रुपन्देही	ठेगाना नखुलेको ।
९	सर्देवा माँझको कुलो सिँचाई सौदेवी	सिँचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	१०००		रुपन्देही	ठेगाना नखुलेको ।
१०	झाक्री थान कुलो मर्मत	सिँचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	१०००		रुपन्देही	ठेगाना नखुलेको ।
११	छिलिङ्गखोलाको माज खण्डको खेतको कुलो बाध मरम्मत तथा संरक्षण लुम्बिनी साँस्कृतिक,रुपन्देही	सिँचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	४००		रुपन्देही	योजना र ठेगाना नमिलेको ।
१२	टिकुलीगढ गाउँको इन्द्राहान घर नजिक कुलोमा आर.सि.सि. वाल	सिँचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	१०००		रुपन्देही	ठेगाना नखुलेको ।
१३	जबाई साना सिँचाई प्रणाली, बुटवल १३	सिँचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	१०००		रुपन्देही	ज.उ.स.सम्झौता भइ काम नभएको ।
१४	घोडाहा सिँचाई बोरिङ्ग देवदह-९	सिँचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	१०००		रुपन्देही	भूमिगत सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीमा पठाइएको ।

बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना हुनु पूर्वको)

रु.हजारमा

11

क्र सं	बेरुजु किसिम	जम्मा बेरुजु रकम (आ.ब.२०७४/७५ सम्म)	हाल सम्म फछ्यौट रकम	फछ्यौट %	कैफियत
१	असुल उपर गर्नु पर्ने	१४३६.९५८	७१.९९५	५.०१%	६८.९२८ असुल भई स.प.हुन बाँकी
२	नियमित गर्नु पर्ने	९३५७.८७	५२२९.३९०	५५.८८%	
३	पेशकी	-	-		
	कूल जम्मा	१०७९४.८२८	५३०१.३८५	४९.११%	

बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना पछिको)

रु.हजारमा

12

क्र सं	बेरुजु किसिम	जम्मा बेरुजु रकम (आ.ब.२०८१/८२सम्म)	हाल सम्म फछ्यौट रकम	फछ्यौट %	कैफियत
१	असुल उपर गर्नु पर्ने	७९४७.६५७	१६४६.८३८	२०.७२ %	रकम रु ४१३२.६१० को नियमितको लागि मन्त्रालय पेश गरिएको।
२	नियमित गर्नु पर्ने	२०८८४.६२९	६१४.८६८	२.९४ %	
३	पेशकी	२८१२.००	२८१२.००	१००%	
	कूल जम्मा	३१६४४.२८६	५०७३.७०६	१६.०३%	

केही स्थलगत फोटोहरू

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

14



मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ योजना रुपन्देही

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु



अहिले



इङ्गुरिया सिंचाइ योजना सैनामैना दर ८ रुपन्देही

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

16

पहिले



अहिले



३६ मौजा सिँचाइ प्रणाली अन्तर्गत मोनाजुद
शाखा नहर तिलोत्तमा रुपन्देही




आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

17



भुम्का सियारी सिँचाइ योजना सियारी रुपन्देही

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

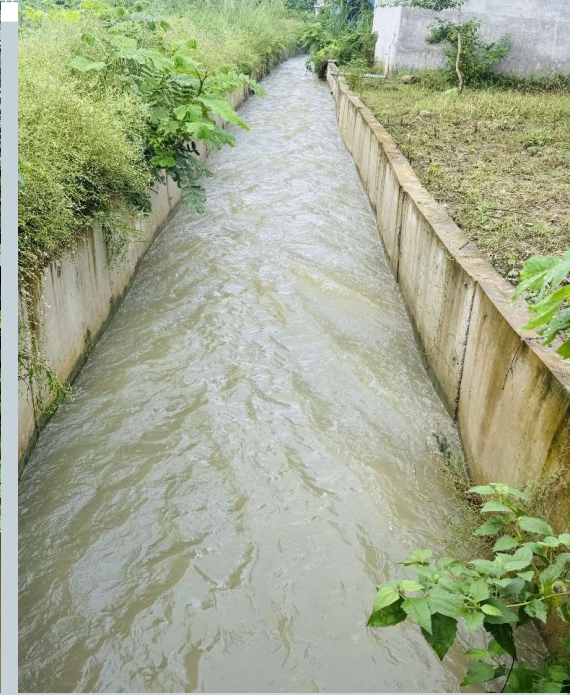

कन्चन सिँचाइ योजना सैनामैना ११, रुपन्देही

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

19




वर्दहवा पुनर्भरण पोखरी निर्माण तिलोत्तमा ७ रुपन्देही



राधाकृष्ण पुनर्भरण पोखरी निर्माण सैनामैना १० रुपन्देही

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

20



एकिकृत कृषि तथा सिँचाइ विकास कार्यक्रम
अन्तर्गत पहेला सिँचाइ योजना सैनामैना ११
रुपन्देही को कार्य ।



आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

21

पहिले



बेम्टेनी सिँचाइ योजना सैनामैना १०,
रूपन्देही



अहिले

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

22



घोला तटबन्ध तथा सिँचाइ योजना सियारी ६ रुपन्देही



बाँसघारी चारपाटा सिँचाइ योजना
सुदोधन ३ रुपन्देही

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु


22



उत्तर पोखराबारी सिँचाइ योजना
बुटवल १८ रुपन्देही



पश्चिम गगांनगर सिँचाइ योजना
सैनामैना ३ रुपन्देही

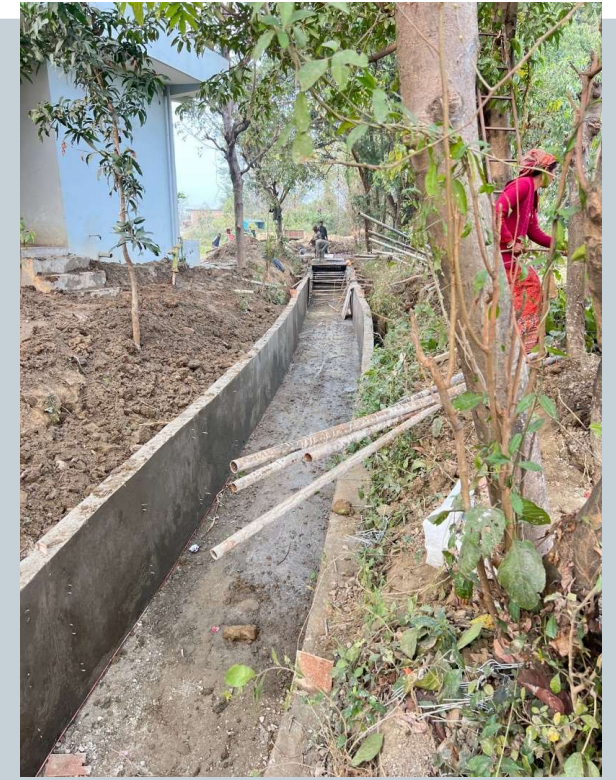

दक्षिण पोखराबारी सिँचाइ योजना
बुटवल १८ रुपन्देही

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

24



पाँचमौजा सिँचाइ योजना बुटवल १७ रुपन्देही

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

25



सुकौली खोला तटबन्ध कार्य सैनामैना २ रुपन्देही

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

26



मुडाबाँस ठाँटीखेत तटबन्ध कार्य देवदह १० रुपन्देही



राजपूरखोला तटबन्ध कार्य बुटवल १२ रुपन्देही

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

27



पहिलाखोला तटबन्ध कार्य सैनामैना ११ रुपन्देही



ज्योतिनगर पहिरो संरक्षण कार्य बुटवल ३ रुपन्देही

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु



माननिय मन्त्रीज्यू र श्रीमान सचिवज्यू लगायतको
टिमबाट मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ लगायतका योजनाको
अनुगमन

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

29



संस्थागत विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न ज.
उ. स. का पदाधिकारी तथा कृषकहरुलाई
अन्य जिल्लाका सिँचाई योजनाको अध्ययन
अवलोकन भ्रमण





कुनै जिज्ञासा तथा सुझाव!
