



आ.व.२०८२।८३ को
अर्ध वार्षिक प्रगति-२०८२

1

प्रस्तुतकर्ता:

डि.प्र. भेष राज भुसाल
जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन
कार्यालय
रुपन्देही

कृषिको आधार : सिंचाइमा सुधार



प्रस्तुती सूची

2

- कार्यालयको जनशक्ति अवस्था
- कार्यालयको समग्र वित्तीय तथा भौतिक प्रगति अवस्था
- मुख्य-मुख्य आयोजनाहरूको प्रगति विवरण
- कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाको विवरण
- थप बजेट आवश्यक पर्ने आयोजनाहरूको विवरण
- कार्यक्रमगत खुद परिमाणात्मक अर्धवार्षिक प्रगति विवरण
- बेरूजु तथा सम्परीक्षणको अवस्था
- केही स्थलगत फोटोहरू

कार्यालयको समष्टिगत जनशक्ति विवरण

| क्र.सं. | सेवा | स्वीकृत दरबन्दी | | | पदपूर्ति | स्थायी रिक्त दरबन्दी | कैफियत |
|---------|-----------|-----------------|---------|-------|----------|----------------------|--------------------------|
| | | स्थायी | अस्थायी | जम्मा | | | |
| १ | प्राविधिक | १० | - | १० | ८ | २ | |
| २ | प्रशासनिक | ६ | - | ६ | ६ | - | कार्यालय सहयोगी समेत गरि |
| | कूल | १६ | १ | १६ | १४ | २ | |

हाल सम्मको (अर्ध वार्षिक) प्रगति सारांश

रु.हजारमा

| क्र.सं | बजेट शिर्षक | सुरुको वार्षिक विनियोजन | संसोधित वार्षिक विनियोजन | अर्धवार्षिक विनियोजन | अर्धवार्षिक खर्च | वित्तीय प्रगति (%) | | भौतिक प्रगति % | कै फि यत |
|-----------|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| | | | | | | अर्धवार्षिक विनियोजनका आधारमा (%) | वार्षिक विनियोजनका आधारमा (%) | | |
| १ | चालु | १३२६० | १३१०० | ६९२१ | ६५२७.२४३ | ९४.३१ | ४९.८२ | | |
| २ | पूँजीगत | २०९५५० | १९१८९१.४५५ | ३३९२९ | १४९१५.९९९ | ४३.९६ | ७.७७ | २८% | |
| क. | समानीकरण/ राजश्व अनुदान | | | | | | | | |
| १ | मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ | ३३७५० | २७९५१.४५५ | १३७०० | ११२४२.१६ | ८२.०५ | ४०.२२ | ४५% | |
| २ | सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम | ३९४४० | ४०९४० | १८५५० | १३८५.३३३ | ७.४६ | ३.३८ | १५% | |
| ३ | जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम | १४००० | १४००० | ७८५० | २२८८.५०६ | २९.१५ | १६.३४ | २५% | |
| ४ | जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम | ४००० | ४००० | १६०० | ० | ० | ० | ५% | |
| ख. | सशर्त अनुदान | | | | | | | | |
| १ | मर्मत संभार आयोजनाहरु | ८५००० | ८५००० | ३९ | ० | ० | ० | ३०% | |
| २ | नदी नियन्त्रण | २०००० | २०००० | ४० | ० | | | ५०% | |
| | कूल जम्मा | २०९५५० | १९१८९१.४५५ | ३३९२९ | १४९१५.९९९ | ४३.९६ | ७.७७ | २८% | |

आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था (सिंचाइ)

| सि.नं. | कार्यक्रमको नाम | आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था (संख्या) | | | | | | | कैफियत | |
|--------|--|---|--------------------|-----------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|----------|--------|------------------------|
| | | कूल आयोजना संख्या | ठेक्का आह्वान भएका | | कार्यान्वयनको प्रकृत्यामा रहेका | सम्झौता भएका | यस आ.व.को हालसम्म सम्पन्न भएका | | | कार्यान्वयन हुन नसक्ने |
| | | | अघिल्लो आ.व.मा | यस आ.व.मा | | | हालसम्म | सम्पन्न | | |
| क | समानिकरण | | | | | | | | | |
| १ | मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ | १४ | ३ | ४ | ५ | ७ | ० | २ | | |
| २ | सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार | ४४ | ० | ३० | १० | ३० | ९ | ४ | | |
| ३ | जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन | १३ | ० | १० | २ | १० | ६ | १ | | |
| ४ | जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण | २ | ० | ० | २ | ० | ० | ० | | |
| | समानिकरण जम्मा | ७३ | ३ | ४४ | १९ | ४७ | १५ | ७ | | |
| ख | सशर्त | | | | | | | | | |
| | मर्मत संभार आयोजनाहरू | ४ | ० | ४ | ० | ४ | ० | ० | | |
| | नदी नियन्त्रण | २ | ० | २ | ० | २ | ० | ० | | |
| | सशर्त | ६ | | ६ | | ६ | | | | |
| | कुल जम्मा (क+ख) | ७९ | ३ | ५० | १९ | ५३ | १५ | ७ | | |

कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरुको समष्टिगत भौतिक प्रगति

| क्र.सं. | कार्यक्रमको नाम | कूल आयोजनाहरुको संख्या | >८०% प्रगति भएको संख्या | ५०-८०% प्रगति भएको संख्या | <५०% प्रगति भएको संख्या | कार्यान्वयन हुन नसकेका |
|---------|--|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| क | समानिकरण | | | | | |
| १ | मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिं | १४ | १ | २ | ९ | २ |
| २ | सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार | ४४ | ९ | ५ | २६ | ४ |
| ३ | जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन | १३ | ६ | ० | ६ | १ |
| ४ | जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण | २ | ० | ० | २ | ० |
| | समानिकरण जम्मा | ७३ | १६ | ७ | ४३ | ७ |
| ख | सशर्त | | | | | |
| | मर्मत संभार आयोजनाहरु | ४ | ० | ० | ४ | ० |
| | नदी नियन्त्रण | २ | ० | १ | १ | ० |
| | सशर्त जम्मा | ६ | ० | १ | ५ | ० |
| | कुल जम्मा (क+ख) | ७९ | १६ | ८ | ४८ | ७ |

मुख्य-मुख्य आयोजनाहरुको प्रगति विवरण

रु.हजारमा

| क्र. सं. | कार्यक्रमको नाम | अर्धवार्षिक बजेट | अर्धवार्षिक खर्च | अर्धवार्षिक प्रगति | | कैफियत |
|----------|---|------------------|------------------|--------------------|-------------|--------|
| | | | | भौतिक (%) | वित्तीय (%) | |
| क | कार्यक्रमको नाम | | | | | |
| १ | भुम्का सियारी बाँध सिंचाइ योजना, रुपन्देही । | १२०० | ३५९३ | ० | २९९.४१ | |
| २ | कंचन सिंचाइ योजना, सैनामैना न.पा. १०,११ रुपन्देही । | १५०० | ३५३९ | ० | २३५.९३ | |
| ३ | ५ मौजा तपाहा सिंचाइ योजना बुटवल १८,१९ रुपन्देही । | १२०० | २८७९ | १०० | २३९.९१ | |

कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाको विवरण

| क्र.सं. | आयोजनाको नाम | कार्यक्रम | वार्षिक विनियोजन (रु.हजारमा) | जिल्ला | कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण |
|---------|--|--|------------------------------|-----------|---|
| १ | रोहिणी सिंचाई योजना, देवदह, तिलोत्तमा | मझौला तथा बैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम | 1200 | रुपन्देही | करिब ५ वर्षदिखी योजना अलपत्र अवस्थामा कसरी अगाडी बढ्ने निर्णयमा पुग्न नसकिएको । |
| २ | मैनहवा पक्कि डाँड सिं. यो., तिलोत्तमा १० | मझौला तथा बैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम | 1200 | रुपन्देही | थोरै बजेटको कारण कार्यान्वयन गर्न कठिन । |
| ३ | कृष्णपुर बुटवल हुदै तुलसीजञ्ज जोड्ने कुलो सिंचाई आयोजना | सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम | ८०० | रुपन्देही | ठेगाना नखुलेको । |
| ४ | सर्देवा माँझको कुलो सिंचाई सौदेवी | सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम | ८०० | रुपन्देही | ठेगाना नखुलेको । |
| ५ | झाक्री थान कुलो मर्मत | सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम | ८०० | रुपन्देही | ठेगाना नखुलेको । |
| ६ | छिर्लिङ्गखोलाको माज खण्डको खेतको कुलो बाध मरम्मत तथा संरक्षण लुम्बिनी साँस्कृतिक,रुपन्देही | सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम | ३२० | रुपन्देही | योजना र ठेगाना नमिलेको । |
| ७ | वडा नं. ३ र ४ को पक्की पुलमुनि वारीपारी करिब २०० घरहरु संरक्षण गर्न तटबन्ध निर्माण | जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम | १६०० | रुपन्देही | ठेगाना नखुलेको । |

कार्यक्रमगत खुद परिमाणात्मक अर्धवार्षिक प्रगति विवरण (सिंचाइ)

| क्र. सं. | कार्यक्रमको नाम | सिंचाइ बाँध/मुहान | पक्की नहर/कुलो | लिफ्ट सिंचाइ | डिप/स्यालो ट्युबवेल (बोरिङ्ग) | पम्प हाउस | पाइप लाइनिङ | बिद्युति करण | थप सिंचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्र | सिंचाइ संरचना सुदृढीकरण गरेको क्षेत्र | नदीमा नियन्त्रण (तटबन्ध निर्माण) | नदी नियन्त्रण बाट उकास भएको जमिन | तटबन्धबाट सुरक्षित भएको | |
|----------|--|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------|-----------|-------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|
| क | समानिकरण | वटा | कि.मी. | वटा | वटा | वटा | कि.मी. | वटा | हे. | हे. | कि.मी. | हे. | घर | हे. |
| १ | मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार | - | ०.५६ | | | | | | | ५० | | | | |
| २ | जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण | - | ०.५० | | | | | | | ४५ | | | | |
| ३ | समानिकरण जम्मा | | १.०६ | | | | | | | ९५ | ०.१८ | २ | ५ | |
| ख | संघ सशर्त अनुदान | | | | | | | | | | | | | |
| १ | मर्मत संभार आयोजनाहरु | - | ०.३० | | | | | | | ३० | | | | |
| २ | नदी नियन्त्रण | - | | | | | | | | | ०.३३ | | | १० |
| | जम्मा | | ०.३० | | | | | | | ३० | ०.३३ | | | १० |
| | कुल जम्मा क+ख | | १.३६ | | | | | | | १२५ | ०.५३ | २ | ५ | १० |

थप बजेट आवश्यक पर्ने आयोजनाहरुको विवरण

| क्र.सं. | आयोजनाको नाम | चालु आ.व. मा विनियोजन | सम्झौता रकम | सम्झौता मिति | सम्झौताको म्याद | हालसम्मको खर्च | भौतिक प्रगति | थप आवश्यक बजेट | कैफियत |
|---------|---|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|
| १ | भुम्का सियारी बाँध सिँचाइ योजना, रुपन्देही । | ४०००.०० | ७३९१५.३७ ५ | १५/०६/ २०७७ | ३०/११/ २०८२ | ७१५४३.८० | ९० | ५००० | ७३२५.०१५ scalation सहित |
| २ | कंचन सिँचाइ योजना, सैनामैना न.पा. १०,११ रुपन्देही । | ४०००.०० | ४६४४५.४० २ | ०३/०९/२ ०७९ | ३०/११/ २०८१ | ३२४८४.९२ | ७५ | १४००० | ५७७.८३२ scalation सहित |
| ३ | ५ मौजा तपाहा सिँचाइ योजना बुटवल १८,१९ रुपन्देही । | ४०००.०० | १०४९५.०७ ९ | ११/११/२ ०८१ | १०/०५/ २०८३ | ७०९६.०७६ | ७५ | ३००० | मोविलाइजेसन पेशकी समेत |
| | | | | | | जम्मा | | २२००० | |

सन्चित कोषमा रकम कमी भइ भुक्तानी हुन नसकेको रकमको विवरण

| क्र. सं. | ठेक्का नम्बर | योजनाको नाम | निर्माण व्यवसायिको नाम | भुक्तानी हुन नसकेको रकम |
|----------|---------------------------|---|--|-------------------------|
| १ | WRIDDO/RUP/ NCB -01/81-82 | पहेला बनकट्टी समाबेसीटोल तटबन्ध , सैनामैना १० रुपन्देही | कक्षपति बिल्डर्स प्रा लि ,टोखा १० काठमाडौं | ५९०.२०० |
| | | | जम्मा | ५९०.२०० |

- भुक्तानी प्रमाणित नभएको र क्रियाकलापमा नभएको ।।
- कार्य गर्न बाँकी र म्याद थप समेत नभएको ।।।

बेरुजु सम्बन्धी विवरण

रु.हजारमा

| क्र. सं. | बेरुजु किसिम | रकम | हाल सम्मको फछ्यौट रकम | हाल सम्मको फछ्यौट % | यस आ.व.को फछ्यौट रकम | यस आ.व.को फछ्यौट % | कैफियत |
|----------|--------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---|
| क | प्रदेश स्थापना हुनु अघिको | | | | | | |
| १ | असुल उपर गर्नु पर्ने | १४३६.९५ | ३.०७ | ०.२१ | | | |
| २ | नियमित गर्नु पर्ने | ९३५७.८७ | ६४७.३९ | ६.९२ | | | |
| ३ | पेशकी | ० | ० | ० | | | |
| | जम्मा | १०७९४.८२ | ६५०.४६ | ६.०२ | | | |
| ख | प्रदेश स्थापना पश्चात २०८१/८२ सम्मको | | | | | | |
| १ | असुल उपर गर्नु पर्ने | ७४५२.३ | १०१६.९ | १३.६ | ३८३.०१४ | ५.१३ | ३८३.०१४ |
| २ | नियमित गर्नु पर्ने | १३७३८.१५ | ० | ० | | | असुल उपर भै भौचर प्राप्त सं.प.हुन बाँकी |
| ३ | पेशकी | १५४८.०० | १०००.०० | ६४.५ | | | |
| | जम्मा | २२७३८.४५ | २०१६.९० | ८.८७ | | | |
| | कुल जम्मा | ३३५३३.२७ | २६६७.३६ | ७.९५ | | | |

केही स्थलगत फोटोहरू

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु



मर्चवार लिफ्ट सिंचाइ योजना रुपन्देही

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

15



घोला तटबन्ध तथा सिँचाइ योजना सियारी ६ रुपन्देही



बाँसघारी चारपाटा सिँचाइ योजना
सुदोधन ३ रुपन्देही

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु


16



उत्तर पोखराबारी सिँचाइ योजना
बुटवल १८ रुपन्देही



पश्चिम गगांनगर सिँचाइ योजना
सैनामैना ३ रुपन्देही

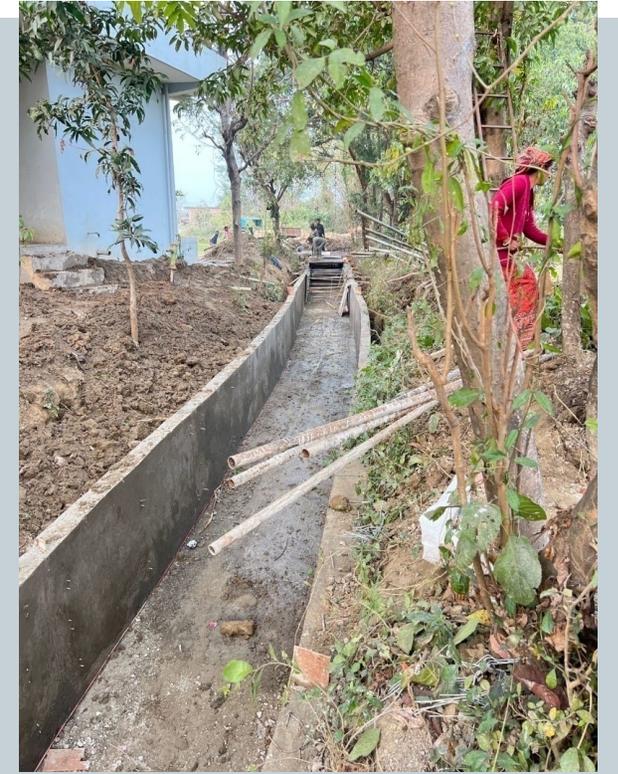

दक्षिण पोखराबारी सिँचाइ योजना
बुटवल १८ रुपन्देही

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

17



पाँचमौजा सिँचाइ योजना बुटवल १७ रुपन्देही

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

18



मुडाबाँस ठाँटीखेत तटबन्ध कार्य देवदह १० रुपन्देही



राजपूरखोला तटबन्ध कार्य बुटवल १२ रुपन्देही

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

19



पहिलाखोला तटबन्ध कार्य सैनामैना ११ रुपन्देही



ज्योतिनगर पहिरो संरक्षण कार्य बुटवल ३ रुपन्देही
